

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

OFICIO: UICSLP RC 347/2022-2023.

ASUNTO: Informe trimestral FAM.

San Luis Potosí, S.L.P., a 17 de abril de 2023

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Dirección de Fortaleciendo Institucional
Presente.-

Adjunto al presente, el quinto informe con el avance trimestral correspondiente a los meses de enero a marzo del año en curso, sobre el mantenimiento preventivo apoyado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2022 en beneficio de las Unidades Académicas de Cerritos, Ciudad Valles, Matlapa, Tamuín, Tamazunchale, Tanquian de Escobedo, Tancanhuitz y Villa de Reyes de la Universidad a mi cargo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente



Dra. Aurora Orduña Correa
Rectora



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

MPS'JRTU/MAE'MIAG

Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, para su conocimiento.

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), para su conocimiento.

Mtro. Ernesto Scheinvar Gottdierner, Encargado de la Dirección de Educación Intercultural, para su conocimiento.

Archivo

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mariano Arista #925, Col. Tequisquiapan, C.P. 78230, Tel. (444) 8-13-80-70.
Correo Electrónico: planeacion@uicslp.edu.mx
San Luis Potosí, S.L.P.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Abril_2023

FECHA DE CORTE: 31-03-2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Entidad Federativa: San Luis Potosí

Clave tra RIT: 24M5U00102



Nombre: José Ramón Toledano Jiménez

Cargo: Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 01-444-6-13-9070, 01-444-1-28-8450 y 01-444-1-28-8452

Correo electrónico: jramos@uicslp.edu.mx

Planeación

Clave y Mantenimiento

Nombre: N/A

Cargo: N/A

Teléfono: N/A

Correo electrónico: N/A

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


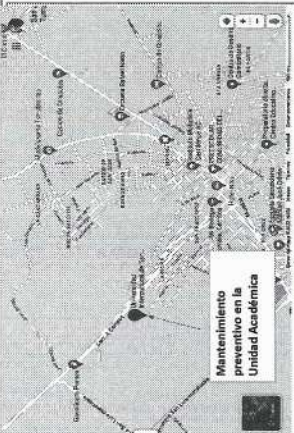
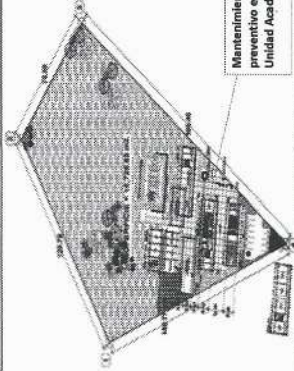


Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Especificaciones y tipo de proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, Si ya fue inaugurada, Cuenta con Acta, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, ¿Cuenta con fotos del evento?, ¿Cuenta con Acta de Recepción?, ¿Cuenta con Acta de Entrega-Recipiente?



Dr. Aurora Odilia Puga
Rectora

1 Se capturará los expedientes que cancelan a la obra o proyecto. Se podrá anular tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos o acciones que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en caso contrario de: mm y aa.

MPS - Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

2022 AÑO	 UICSLP UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ <small>UNIVERSITY OF SAN LUIS POTOSÍ</small> <small>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ</small>	91.3 Porcentaje de avance	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEU) DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado Abril, 2023 <small>FECHA DE CORREL: 31-03-2023</small>
REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL					
PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Cerritos		UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO			
					
Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Cerritos Calle Álamo No. 51 Col. Aurora CP.79447 Cerritos, S.L.P.		Calle Álamo No. 51 Col. Aurora CP.79447 Cerritos, S.L.P.			
FOTOS					
Comentarios de los trabajos realizados:					
En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Nota: las imágenes de la terminación se agregarán una vez sean enviadas por el IEIFE					
 Dra. Aurora Olaya Correa Rectora		 UICSLP RECTORIA CLAVE ZAM5U06102			
MPS. José Ramón Tolentino Jiménez Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional					

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postal, se podrán copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Código: 01-444-1-28-44-52

Nombre: N/A
Cargo: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A

Nombre: N/A
Cargo: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto. 1		Acciones que sustentan el avance 2	Avances por realizar	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Clases)			Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
						Espacio físico	Metros cuadrados			Inicio	Termino		¿Cuenta con todos los planos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró el evento?	Entrega y recepción (Inicio)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa			
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Matlapa	X	\$ 265,067.00	\$ 265,067.00	\$ -	1	2650.10	En el trimestre que se reporta se continuaron los trabajos a la fecha no se reportaron acciones que sustentan el seguimiento de eventos en las oficinas UICSLP RC 217/2022-2023, UICSLP RC 218/2022-2023, UICSLP RC 219/2022-2023, UICSLP RC 220/2022-2023, UICSLP RC 246/2022-2023, UICSLP RC 247/2022-2023, UICSLP RC 248/2022-2023, UICSLP RC 260/2022-2023, UICSLP RC 268/2022-2023, UICSLP RC 269/2022-2023, UICSLP RC 270/2022-2023, UICSLP RC 288/2022-2023, UICSLP RC 289/2022-2023, UICSLP RC 290/2022-2023, UICSLP RC 291/2022-2023, UICSLP RC 341/2022-2023, UICSLP RC 342/2022-2023, UICSLP RC 343/2022-2023.	100	29/03/22	31/11/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) es la instancia beneficiaria y el EIFE efectúan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						TOTAL	1	2650.1												



Dr. Aurora Cecilia Casas
Rectora

MPS, José Ramón Tolentino Jiménez
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se exploran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

FAM
FONDO DE APOYACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril 2023
RECORRIDO: 312032933




Porcentaje de avance

100

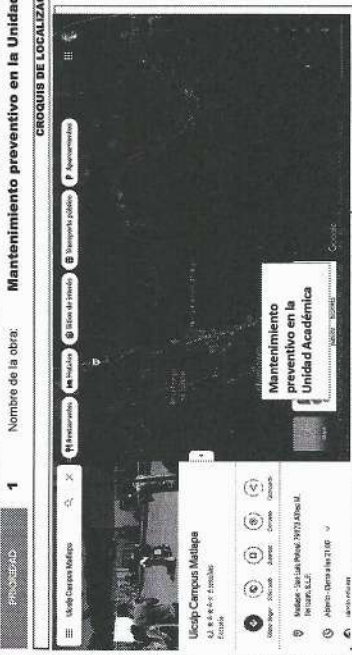

Nombre de la obra: **Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Matlapa**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

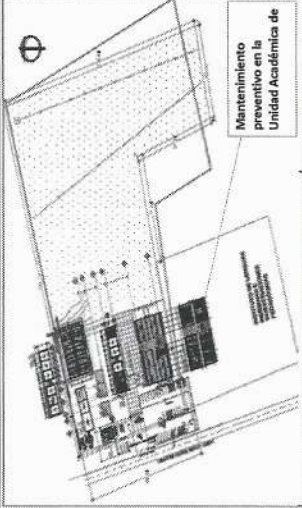

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Nacional México Laredo km 212.CP79970
Matlapa, S.L.P.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
Nota: las imágenes de la terminación se agregarán una vez sean enviadas por el IEIFE



Dra. Aurora Ornela Corona
Rectora

Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_2023
 FECHA DE CORTE 31-03-2023

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**

Entidad federativa: **San Luis Potosí**

Clave del B1: **206100102**

Nombre: **MPS. José Ramón Tolentino Jiménez**
 Cargo: **Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional**
 Teléfono: **01 444 413-80-70, 01 444-1-28-84-50 y 01 444-1-28-84-52**
 Correo electrónico: **planeacion@uicsp.edu.mx**



Nombre: **NA**

Cargo: **NA**

Teléfono: **NA**

Correo electrónico: **NA**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1		Acciones que sustentan el avance?	Aciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas	
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisición y mejoras				Requerimiento	Espacios, cantidad				Metros cuadrados	Inicio		Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuál y cuándo inaugurado?		Entrega (Acta de Recepción)
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tamazunchale	X			\$ 189,336.00	\$ 189,336.00	\$	1	1124.54	En el trimestre que se reporta se continuaron los trabajos a la fecha no se puede contar el fondo para el pago de los trabajos con los fondos UICSLP RC 217/2022-2023, UICSLP RC 218/2022-2023, UICSLP RC 219/2022-2023, UICSLP RC 245/2022-2023, UICSLP RC 246/2022-2023, UICSLP RC 247/2022-2023, UICSLP RC 248/2022-2023, UICSLP RC 249/2022-2023, UICSLP RC 250/2022-2023, UICSLP RC 268/2022-2023, UICSLP RC 269/2022-2023, UICSLP RC 270/2022-2023, UICSLP RC 289/2022-2023, UICSLP RC 290/2022-2023, UICSLP RC 291/2022-2023, UICSLP RC 292/2022-2023, UICSLP RC 341/2022-2023, UICSLP RC 342/2022-2023 y UICSLP RC 343/2022-2023.	Dar cumplimiento al presupuesto del IEFIE del fondo.	100	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Unidad Académica de Tamazunchale (UICSLP) es la responsable beneficiada frente a la SEGE y el IEFIE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								TOTAL	1	1124.54										

\$ 189,336.00 \$ 189,336.00 \$ 00.00

UICSLP

 INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

 RECTORIA

 CLAVE

 24-03-2023

Dra. Aurora Olivares Chávez

 Rectora

MPS. José Ramón Tolentino Jiménez

 Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo

1 Se captarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.

 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE-SU)
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
Abril 2023
TELÉFONO: 099 921 21 93 2923

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

100

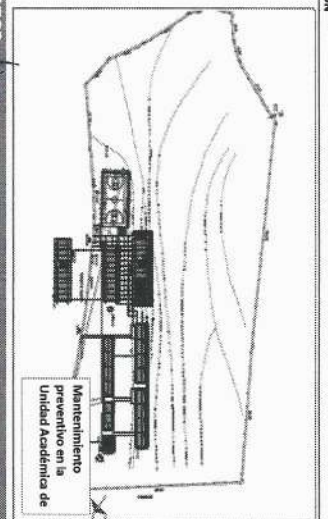

Av. Hidalgo SM Comunidad Mecatlan y sus barrios
CP79991, Tamasunchale S.L.P.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de San Luis Potosí, Intercultural de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
Nota: las imágenes de la terminación se agregaran una vez sean enviadas por el IEIFE

Dr(a) Aurora Ordóñez Torres
Rectora



Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_2023
FECHA DEL CORTE: 31.03.2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Clave sat B17: 24MSLU0102

Nombre: MPS José Néstor Talentino Jiménez
Cargos: Encargado de Subdirección de Fomento Institucional
Teléfono: 01-444-413-3870, 01-444-428-6450, 01-444-428-6452
Correo electrónico: pabrator@ucslp.edu.mx

Parceles

Nombre: N/A
Cargo: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A

Cursos y Matriculamiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Prioridad	Tipo de proyecto				Monto acordado	Monto autorizado	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar 3	% de avance	Fecha 4		Observaciones	¿En susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta por Actas			
		Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Manejamiento	Proyecto sustentable				Espacio físico	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			Cuenta con libros de registro del evento?	Entrega de Acta de Recepción (Acta final)		Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	1	X				\$ 167,427.00	\$ 167,427.00	\$ 167,427.00	1	1057.60		En el momento que se reporta se continúan los trabajos a la fecha no se puede cerrar el fondo para el seguimiento se emitió un oficio de UCSP 217/2022-2023, UCPSLP RC 218/2022-2023, UCPSLP RC 246/2022-2023, UCPSLP RC 246/2022-2023, UCPSLP RC 247/2022-2023, UCPSLP RC 248/2022-2023, UCPSLP RC 283/2022-2023, UCPSLP RC 283/2022-2023, UCPSLP RC 289/2022-2023, UCPSLP RC 289/2022-2023, UCPSLP RC 290/2022-2023, UCPSLP RC 291/2022-2023, UCPSLP RC 341/2022-2023, UCPSLP RC 342/2022-2023 y UCPSLP RC 343/2022-2023.	Dar seguimiento al tema en el IEFE del fondo.	80	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UCISLP) es la instancia beneficiaria donde la SEGE y el IEFE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL										1057.6														



Dra. Aurora Orihuela Palma
Rectora

MPS José Néstor Talentino Jiménez
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo

1 Se copiará los espacios que manifiestan a la obra o proyecto. Se podrán anotar bases fijas como sea necesario.
2 En esta sección se indicará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, informos que se vean reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEUSU)
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA


Mes reportado
April_2023
FECHA DE CORTE: 31/03/2023



UICOSP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

Potencial de avance

50

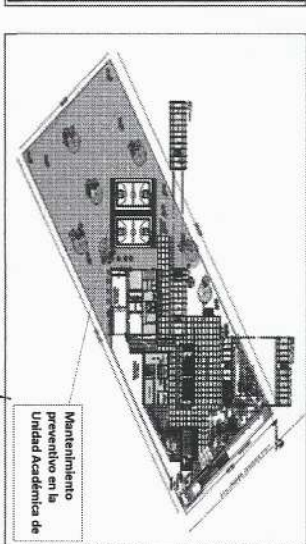



FOTOS

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera a la estación Tamulín Numero 921 Col.
Ampliación pueblo Nuevo CP. 79207 Tamulín S.L.P.




Nombre de la obra: **Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tamulín**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

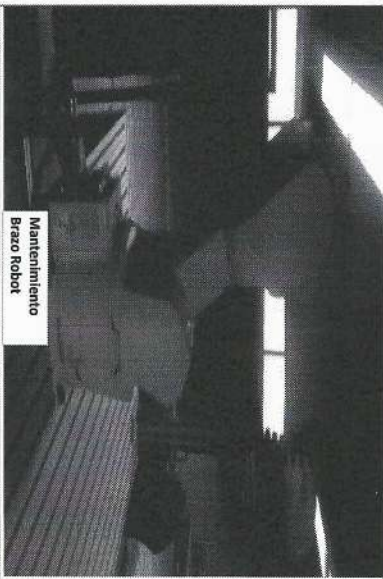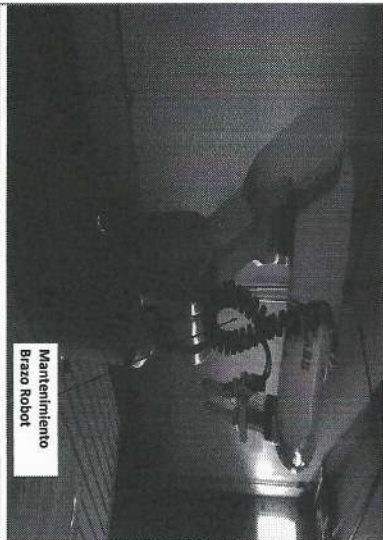

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tamulín de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

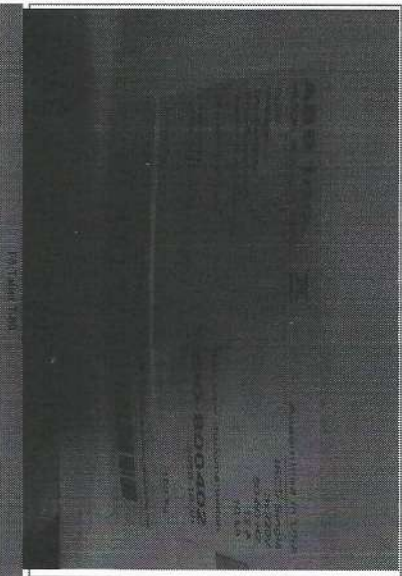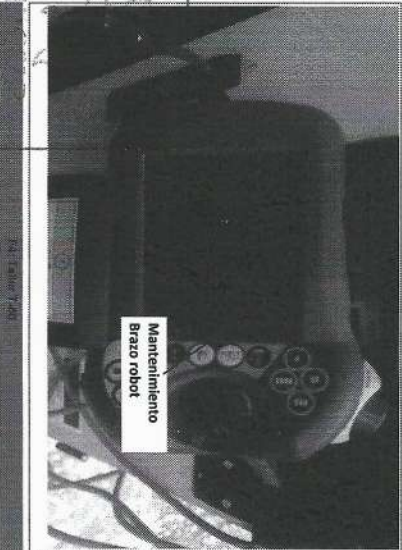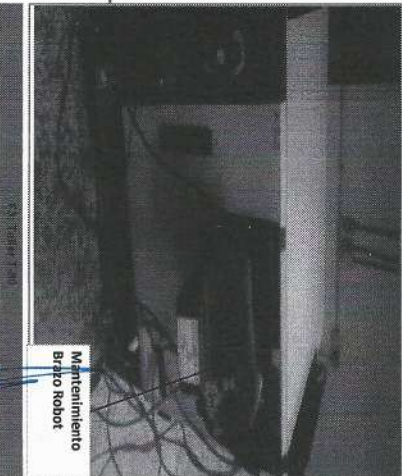

Dr(a) Aurora Ojeda Torres
Rectora

RECTORIA
CALLE
24MSU06102

Embargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
Abril_2023
FECHA DE CORTE: 31/03/2023




Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**
Entidad federativa: **San Luis Potosí**
Código del IRI: **24NSL00102**
Nombre: **MPS, José Ramón Tolentino Jiménez**
Cargo: Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 01 444-15-8030, 01 444-128-6400 y 01 444-128-8452
Correo electrónico: **planeacion@uicslp.edu.mx**

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLES
Nombre: N/A
Cargo: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A

Nombre del proyecto	Prioridad	Tipo de proyecto				Monto ejercido	Monto autorizado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el análisis	Acabados por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Cualquier obra)	Si ya fue inaugurada			Monto de Aca de Administrativa										
		Otros de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacios/equipo	metros cuadrados construidos				Inicio	Término			¿Cuenta con todos los planos y especificaciones?	¿Cuenta con los planos de construcción?	¿Cuenta con los planos de ejecución?		Acta Administrativa de Recepción	Acta de Recepción								
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tancannatz			X		\$ 180,031.00	\$ 180,031.00	\$ -	1	Mantenimiento preventivo a 26 equipos de atlas de acero en el edificio B, instalación de sistema de bombeo	1,457.80		En el trimestre que se reporta se continuaron los trabajos a la fecha no se puede cerrar el fondo para el seguimiento se emitaron los siguientes RC: UICSLP RC 218/2022-2023, UICSLP RC 202/2022-2023, UICSLP RC 246/2022-2023, UICSLP RC 247/2022-2023, UICSLP RC 248/2022-2023, UICSLP RC 288/2022-2023, UICSLP RC 289/2022-2023, UICSLP RC 291/2022-2023, UICSLP RC 342/2022-2023 Y UICSLP RC 343/2022-2023.	Dar seguimiento al tema en el IEFE del fondo.	100	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Unidad Académica de Tancannatz beneficiada con la SEGE y el IEFE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
GLOBAL DEL PROYECTO																																
TOTAL											1	1,457.80																				

\$ 180,031.00 \$ 180,031.00



Dra. Aurora Orihuela Cobles
Rectora

MPS, José Ramón Tolentino Jiménez
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo

1 Se completará los espacios que concierne a la obra o proyecto. Se podrán anotar varias filas como proyecto.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, día, mes y año.

2022
Año




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEUJI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril 2023
FECHA DE CURRÉ: 31/03/2023




Porcentaje de avance

100



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tancanhuitz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

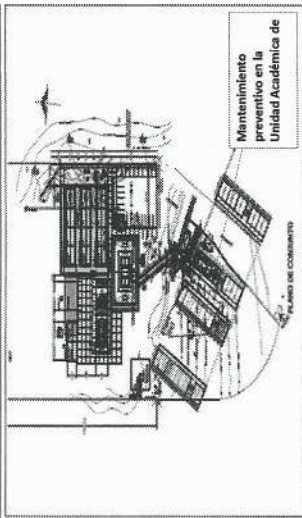




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Francisco I. Madero 56B, Barrio chacana, CP-79800, Tancanhuitz, S.L.P.


FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
Nota: las imágenes de la terminación se agregaran una vez sean enviadas por el IEIFE



Día: Aurora Enrique Correa
Rectoría



Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_2023
FECHA DE CORTE: 31-03-2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD


Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**
Entidad Federativa: **San Luis Potosí**
Clave Int: **24MSU06102**

Datos de Contacto:
Nombre: **MPS José Ramón Valentín Jiménez**
Cargo: **Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional**
Teléfono: **01-444-1-28-84-50 / 01-444-1-28-84-62**
Correo electrónico: **Jiménez@uiculp.mx**

Datos de la Institución:
Nombre: **NA**
Cargo: **NA**
Teléfono: **NA**
Correo electrónico: **NA**

Objeto y Mantenimiento

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1		Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fecha 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Cause)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Acta	
		Otra de conformidad	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento			Proyecto sustentable	Inicio				Término	¿Cuenta con foto del evento?			¿Quién y cuando inauguró el evento?	Acta Administrativa de Entrega- Recepción		Monto de Acta Administrativa
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo		X			\$ 87,438.00	\$ 87,438.00	1	514.58	En el momento que se reporta se continúan los trabajos a la fecha no se puede cerrar el fondo para el seguimiento se empujaron los trabajos a la fecha de RC 217/2022-2023, UICSLP RC 218/2022-2023, UICSLP RC 219/2022-2023, UICSLP RC 220/2022-2023, UICSLP RC 247/2022-2023, UICSLP RC 248/2022-2023, UICSLP RC 280/2022-2023, UICSLP RC 289/2022-2023, UICSLP RC 290/2022-2023, UICSLP RC 341/2022-2023, UICSLP RC 342/2022-2023 y UICSLP RC 343/2022-2023.	Dar seguimiento al tema en el IEFE del fondo.	10	13/12/22	10/02/23	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) es la instancia beneficiada donde la SEGE y el IEIFE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL					\$ 87,438.00	\$ 87,438.00	1	514.58											



Dra. Aurora Ortiz Gómez
Rectora

MPS: José Ramón Valentín Jiménez
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo

1 Se copiarán las especies que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril 2023
FOLIO DE CORTE: 31-03-2923



Porcentaje de avance



10

PROYECTO

1 Nombre de la obra:

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

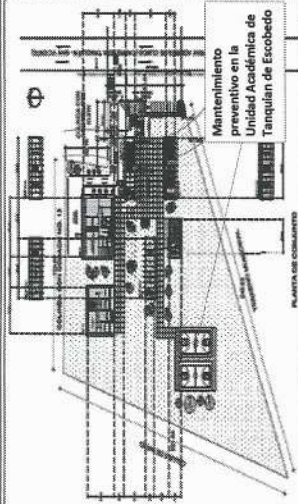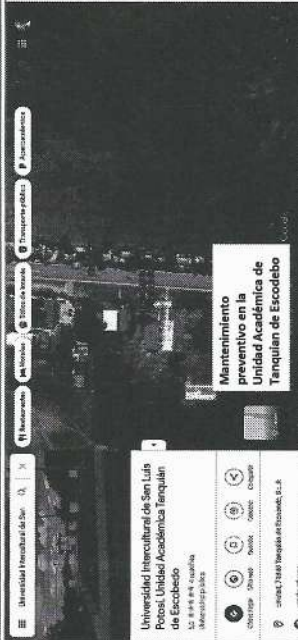

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Xolot-Tamuín Km. 47.5 Colonia unidad CP-79840, Tanquian Escobedo S.L.P.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
Nota: las imágenes de la terminación se agregarán una vez sean enviadas por el IEIFE



[Signature]
Dra. Aurora Calderón Corrales
Rectora

[Signature]
MPS. José Ramón Colantino Jiménez
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE DE DESPESAS DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**
Entidad federativa: **San Luis Potosí**
Clave Inst: **9117-24663-08102**

Nombre: **MES, José Ramón** | Apellido: **Jiménez**
Cargo: **Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional**
Teléfono: **01-444-813-8010, 01-444-1-28-84-09 y 01-444-1-28-84-02**
Correo electrónico: **planeacion@uicsp.edu.mx**

Nombre: **N/A**
Cargo: **N/A**
Teléfono: **N/A**
Correo electrónico: **N/A**

Curso y Matriculación

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Montro autorizado	Montro ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Otra de contabilidad	Equipamiento	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con todos los eventos del evento?	¿Quién inauguró y con qué evento?	Entrega- Recepción (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Valles	X				\$ 167,264.00	\$ 167,264.00	\$ -	1	111.99	111.99	Demolicion de piso loseta 111.99 m2, picado de piso de concreto 111.99 m2, pintura en muros 121.62, loseta de cerámica 111.99m2, pintura en losa 121.62 m2 de concreto 62.41	Dar seguimiento al avance del tiempo del fondo.	10	27/12/22	24/02/23	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) es la instancia beneficiada con la SEGEY se le pide que opere el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL																						



\$ 167,264.00 | \$167,264.00 | \$0.00

[Firma]
Dra. Aurora Oriana Correa
Rectora

[Firma]
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejados en el reporte fotográfico.




2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEU)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Abril 2023
FECHA DE CORTE: 31-03-2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

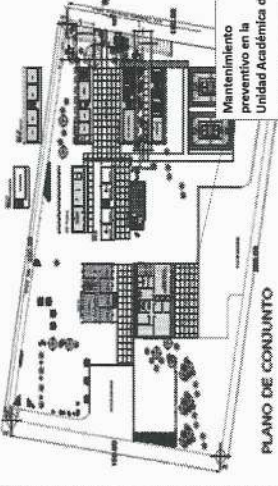 <p>UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADÉMICA DE CIUDAD VALLES</p>	<p>FRANJEADO 1</p> <p>Nombre de la obra: Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Valles</p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Carretera Ciudad Valles km 1.8, CP. 79000 Ciudad Valles S.L.P.</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>10</p>	<p>PLANO DE CONJUNTO</p> 	<p>Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Valles</p>

FOTOS

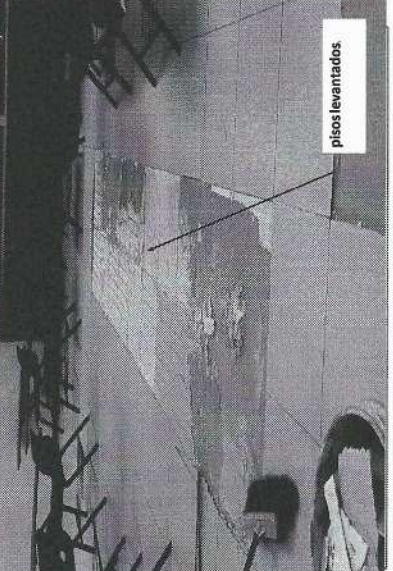 <p>pisos levantados.</p>	<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>En el trimestre que se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Nota: las imágenes de la terminación se agregarán una vez sean enviadas por el IEIFE</p>	<p>RECTORIA</p> <p>CLAVE 24MSU06102</p> <p>Dr. Aurora Orduña Correa Rectora</p>
	<p>RECTORIA</p> <p>CLAVE 24MSU06102</p> <p>Dr. Aurora Orduña Correa Rectora</p>	<p>RECTORIA</p> <p>CLAVE 24MSU06102</p> <p>Dr. Aurora Orduña Correa Rectora</p>

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_2023
FECHA DE CORTE: 31-03-2023

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Entidad federativa: San Luis Potosí

Clave del RUT: 2465206102

Nombre: MFR. José Ramón Tolentino Jiménez

Cargo: Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Teléfono: 01-444-13-80-70, 01-4441-28-84-50 y 01-4441-13-84-52

Correo electrónico: pbrator@uad.edu.mx

Nombre: N/A

Cargo: N/A


Teléfono: N/A

Correo electrónico: N/A

Nombre y Nombres: _____

RESPONSABLE: _____

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Resumen	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Otra de certidumbre	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustancial	Españolaje	metros cuadrados			metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inaugurado?	Entregado (Acta de Entrega y Recepción)	Acta Administrativa
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Villa de Reyes	X				\$ 184,730.00	\$ 184,730.00		1	1523.39			78	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Unidad Académica de Villa de Reyes beneficiada con la SEGE y el EIFE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL					\$ 184,730.00	\$ 184,730.00		1	1523.39			78	29/03/22	31/12/22							



RECTORÍA
C.I.A.V.E.
24MSU06102

Dra. Aurora Ochoa Cerezo
Rectora

MFR. José Ramón Tolentino Jiménez
Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo

1 Se aspirará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los hitos a realizar, indicar que se están verificando en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.


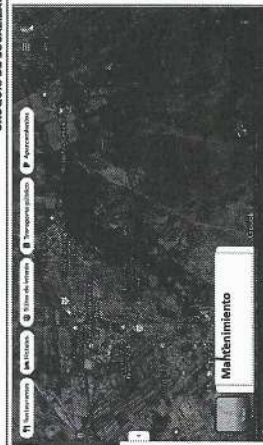

2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



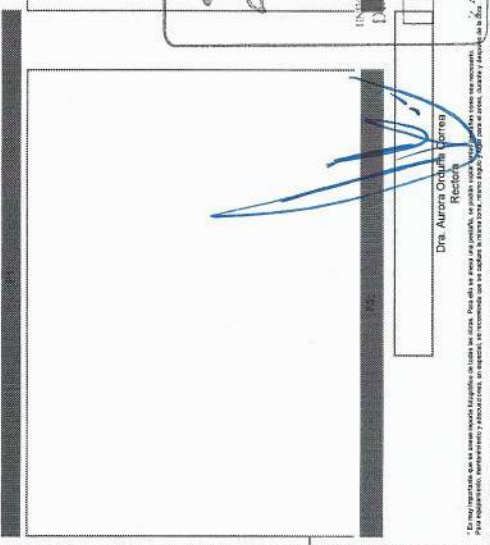
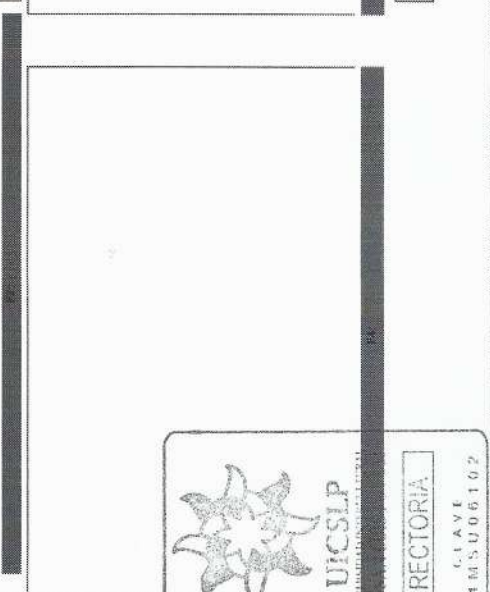
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_2023
FECHA DE CORTE: 31-03-2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 <p>UICSLP UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ</p> <p>Porcentaje de avance 100</p>	<p>PROYECTO 1</p> <p>Nombre de la obra: Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Villa de Reyes</p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p>  <p>Mantenimiento</p>	 <p>Mantenimiento</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>Av. Universidad No.29 Col. La Paz CP.79500 Villa de Reyes, S.L.P.</p>
---	--	---	---

FOTOS

		<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.</p> <p>Nota: las imágenes de la terminación se agregarán una vez sean enviadas por el IIEFE</p>
		<p>Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional</p> <p><i>[Signature]</i></p>



Dr. Aurora Ochoa García
Rectora

Este reporte de avance deberá llenarse en todos los casos. Para más información consulte el manual de instrucciones. Para reportar, mantener y actualizar, en especial, se recomienda que se actualice la información antes de cerrar, mantener y actualizar.
