

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**

**OFICIO: UICSLP RC 096/2022-2023.**

**ASUNTO: Informe trimestral FAM.**

San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de octubre de 2022.

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
**Dirección de Fortaleciendo Institucional**  
**Presente.-**

Adjunto al presente, el tercer informe con el avance trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre del año en curso, sobre el mantenimiento preventivo apoyado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2022 en beneficio de las Unidades Académicas de Cerritos, Ciudad Valles, Matlapa, Tamuín, Tamazunchale, Tanquian de Escobedo, Tancanhuitz y Villa de Reyes de la institución a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**Dra. Aurora Ordoña Correa**  
**Rectora**



2022, "Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí"

MTRO' VHGS/MAE' M'AG

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, para su conocimiento.

Mtra. Ma. de los Ángeles Gordillo Castañeda, Directora de Educación Intercultural, para conocimiento.

Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, para su conocimiento.

Archivo

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**

*"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"*

2022

**FAM**

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
 Septiembre 2022  
 FECHA DE CORTE: 30-09-2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Entidad Federativa: San Luis Potosí

Ciudad: San Luis Potosí



UICSLP

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

Nombre: M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez  
 Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-444-419-8070, 01-444-128-4450 y 01-444-128-9443  
 Correo electrónico: pbsvncor@uicslp.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: N/A

Cargo: N/A

Teléfono: N/A

Correo electrónico: N/A

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *			Acciones que sustentan el avance *	Acciones por realizar	% de avance	Fecha: †		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas					
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio físico				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino	Si ya fue inaugurada	Acta de Constitución	Acta de Recepción	Acta de Entrega
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Carrizos			X	\$ 100,181.00	\$	\$	1	1371.12				0	28/03/22	31/12/22		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					\$ 100,181.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	1371.12	En el trimestre se dio abono al bien con los fondos UICSLP: CG, G, C, P y UICSLP RC 398/2021-2022, UICSLP RC 018/2022, 2023, UICSLP RC 046/2022, UICSLP RC 086/2022, UICSLP RC 096/2022. Se aprobó el presupuesto de trabajo para el ejercicio de 2023, lo más sobresaliente fue el esquema de trabajo por medio de miniprogramas de la UICSLP, a lo cual el EFPE cumplió el fondo.			GLOBAL DEL PROYECTO				En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) se está beneficiando a través de la ejecución de acciones de planeación del proyecto.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					\$ 100,181.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	1371.12														

M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional



1 Se capitalan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden tener varias filas con sus montos.  
 2 En esta sección se reportará de forma breve y concisa los hitos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte de avance.  
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en días digitales: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FORO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESEU)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportes


Septiembre 2022

FECHA DE CORTE 30/09/2022

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Alamo No. 51 Col. Aurora CP 79447 Cerritos, S.L.P.

CIRCUITO DE LOCALIZACION

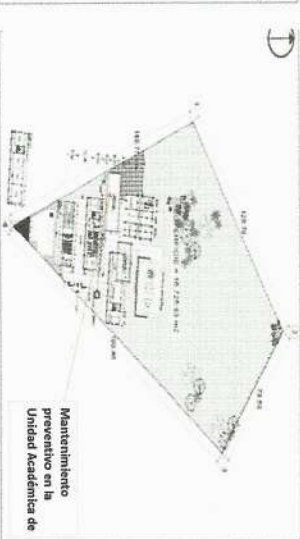

FOTOS

0

Porcentaje de avance



FINANCIADA

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Cerritos



Mantenimiento aires acondicionados



rehabilitación de instalación hidráulica



rehabilitación de instalación hidráulica



sistema hidroneumático



rehabilitación de instalación hidráulica

F1: Aires acondicionados

F2: Sanitarios

F3: Hidroneumático

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Cerritos de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

F3: Hidroneumático


F4: Hidroneumático

F5: Hidroneumático

Dra. Aurora Ciudad Juárez

Reactiva

RECTORIA



24 MAR 2022 10:2

M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez

Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

ESTADO DE LA UNIVERSIDAD

Más informado  
**Septiembre 2022**  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022



Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
 Entidad Federativa: San Luis Potosí  
 Círculo 9711: 24MSU061102

Nombre: M.F. Víctor Hugo Galán Sánchez  
 Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-444-4-1540701, 01-444-1-2844402  
 Correo electrónico: vgalan@uicslp.mx

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *		Acciones que sustentan el avance *	Acciones por realizar	% de avance	Fecha *		Observaciones	¿Es susceptible de ser incluido en el Censo?	Si ya fue inaugurado	¿Cuántos y cuáles son los inmuebles? *	Estrategia de entrega (Acta físico)	Acta de entrega de Recepción	Monto de Acta Administrativa	
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	metros cuadrados				metros cuadrados	Inicio								Termino
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Valles			X		\$ 167,284.00	\$		1	1408.02	En el presente se dio mantenimiento preventivo a 17 edificios de áreas de aseo, acondicionamiento y rehabilitación de instalaciones de hidrosanitarias y secciones de pisos estratificados.	En el presente se dio mantenimiento preventivo a 17 edificios de aseo, acondicionamiento y rehabilitación de instalaciones de hidrosanitarias y secciones de pisos estratificados.	0	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) a través del EIRE de Planeación y Desarrollo Institucional se encuentra en proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						\$ 167,284.00	\$ 50.00		1	1408.02													

Dr. Aurora Quiroz Torres  
 Rectora



M.F. Víctor Hugo Galán Sánchez  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

1. Se explorarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán usar tantos fotos como sea necesario.  
 2. En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
 3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Tomar en cuenta los días: día, mes y año.

2022

MIS

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado



Septiembre\_2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2022



Porcentaje de avanza

0

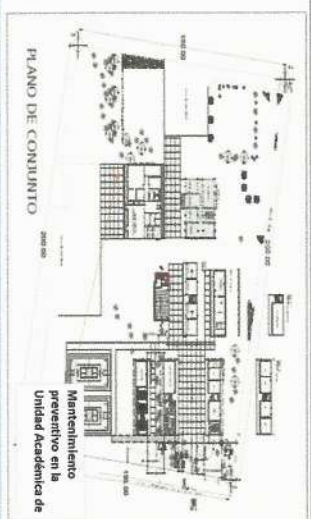
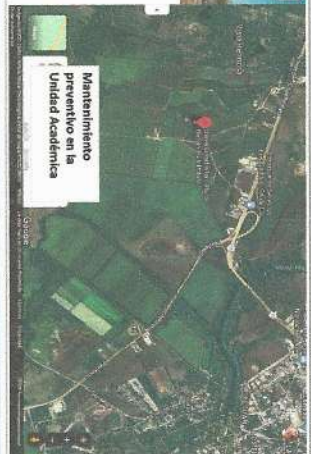


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO  
Carretera Ciudad Valles km 1.8, CP 79000 Ciudad Valles S.L.P.

Recorrido 1  
Nombre de la obra: Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Valles

CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

FOTOS

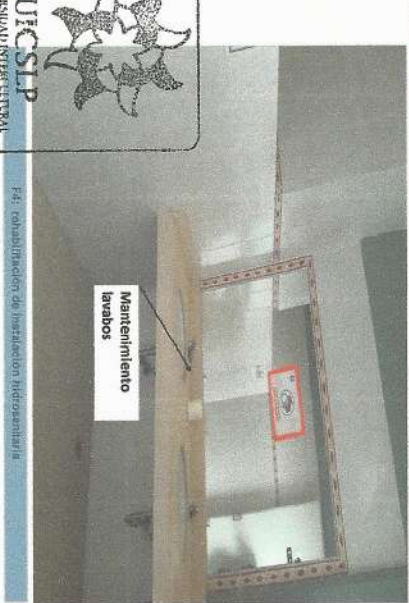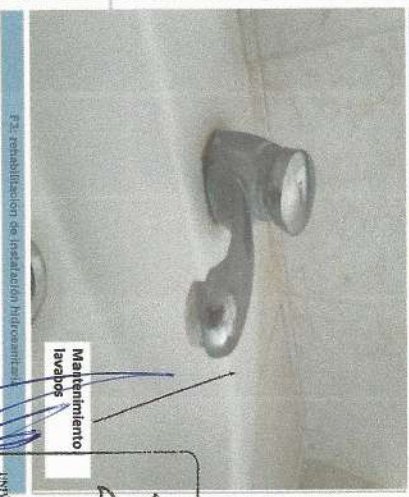

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

F1: Rehabilitación de instalación hidrosanitaria

F2: Rehabilitación de instalación hidrosanitaria

F3: Rehabilitación de instalación hidrosanitaria

UICSSIP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
CALLE  
24MSU06102  
Dra. Aurora Ortaño Correa  
Rectora

M.F. Víctor Hugo Cárdenas Sánchez  
Subdirector de Ejecución y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

datos de la universidad



Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
Entidad federativa: San Luis Potosí  
Calle Post 911: 240008102  
Nombre: M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez  
Cargo: Subdirector de Planeación y desarrollo institucional  
Teléfono: 01-4646739-170; 01-4646732-84-85 y 01-4641-31-84-82  
Correo electrónico: planeacion@uicslp.edu.mx

Nombre: N/A  
Cargo: N/A  
Teléfono: N/A  
Correo electrónico: N/A

Ciclo y Mes de Reporte

¿Es susceptible de inaugurarse? (Calcular)  
¿Cuentas con el evento?  
¿Cuentas con el evento?  
Estrategia (Acta firmada)  
Acta Administrativa de Entrega- Recepción  
Fecha de Acta Administrativa

datos del avance del proyecto

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Fuente autorizada	Fuente ejercida	Restante	Avance del proyecto en cuanto a etapas físicas y tipo de proyecto <sup>1</sup>				Archivos que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de inaugurarse? (Calcular)	Si ya fue inaugurada								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Esperando equipo	cantidad	metras cuadradas			% de avance	Inicio			Termino	Cuenta con el evento?	¿Cuenta con el evento?	Estrategia (Acta firmada)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Fecha de Acta Administrativa			
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Matlapa		X							1	29810	29810	29810	2022-10-28		29/03/22	31/12/22			N/A	N/A	N/A	N/A				
		TOTAL							1	29810																	
															GLOBAL DEL PROYECTO												



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
CALLE POST 911  
240008102

M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se capturarán las acciones que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán omitir etapas físicas cuando sean inexistentes.  
2 En esta sección se analizará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mostrando que se están realizando en el reporte de avance.  
3 En aquellos casos en los que no se haya iniciado, indicar la fecha en la que se espera iniciar.

2022

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEUSU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**Septiembre 2022**  
FECHA DE OBRAS: 30/09/2022

ANOS

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance

5

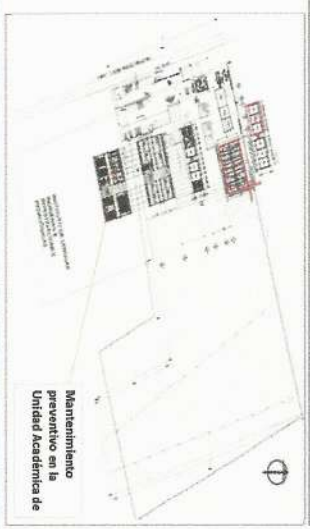

Carretera Nacional México Laredo km 212 CP795970  
Matlapa, S.L.P.


FOTOS

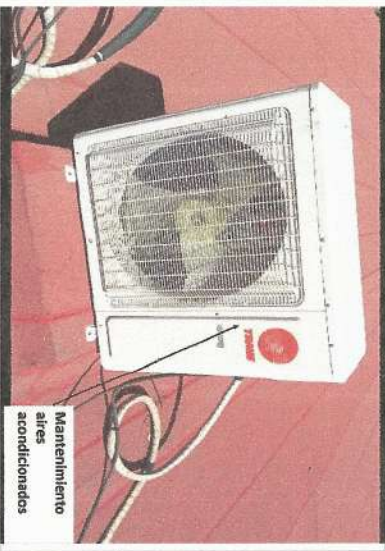


Mantenimiento aires acondicionados




Mantenimiento sanitarios

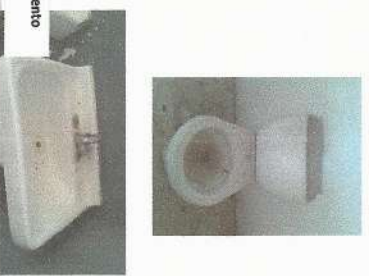


Mantenimiento sanitarios

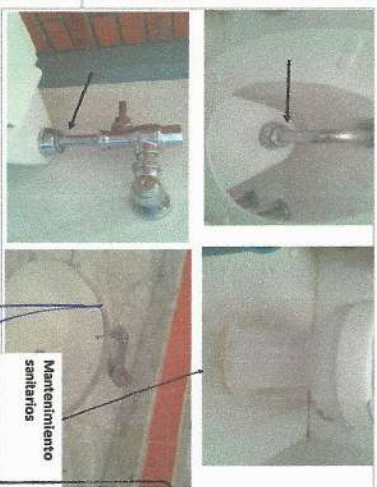

Mantenimiento sanitarios



Bombas



Pintura exterior




Pintura exterior

F5: Edificio U22

F7: Espacio de conexión edificio E

F8: Espacio de conexión edificio E

Dra. Aurora Córdova / Zeres  
Receps



M.F. Víctor Hugo Garvín Sánchez  
Subdirector de Reparación y Mantenimiento Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE-SU)  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Datos de la Universidad



Nombre: M.F. Víctor Hugo Galán Sánchez  
 Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-4444-134070, 01-4441-284450 y 01-4441-284451  
 Correo electrónico: vpgalan@uicslp.edu.mx

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Fogonamiento	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>		Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuota con Actas			
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Equipamiento				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino	¿Cuánta con todos los eventos?		¿Cuál y cuándo inauguró?	Entregado (Fecha entrega)	Actas Adjuntas vía de Entrega- Recepción
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Temascalchalte			X			\$ 169,538.00	\$ -		1	1124.54				50	29/03/22	31/12/22		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							\$ 169,538.00	\$ 0.00																

Dra. Aurora Ocaña Correa  
 Rectora



M.F. Víctor Hugo Galán Sánchez  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

Mes: septiembre  
 Septiembre 2022  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2022

1 En cualquier los espacios que sustentaron a la obra o proyecto. Se podrán mostrar tanto físicamente como con fotografías.  
 2 En cada acción se detallará la forma de avance y con los trabajos a realizar, mismos que se serán reflejados en el reporte fotográfico.  
 3 Es importante que los fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd/mm/aa.



2022

MDS



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESEU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**Septiembre 2022**  
FECHA DE EMISIÓN: 30-09-2022

FONDO DE APOYADOS MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


UBICACION DE LA OBRAS O PROYECTO

Av. Hidalgo SM Comunalidad Mecatlan y sus barrios  
CP79991 Tamazunchale S.L.P



Porcentaje de avances

50

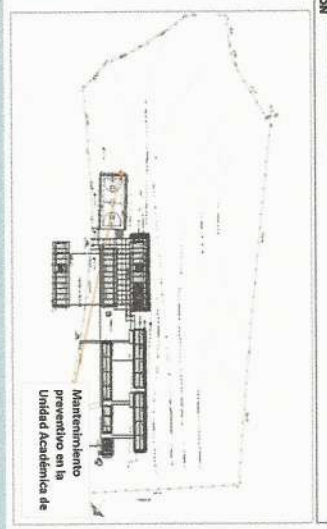

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:


En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tamazunchale de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.



Mantenimiento aires acondicionados



Mantenimiento aires acondicionados

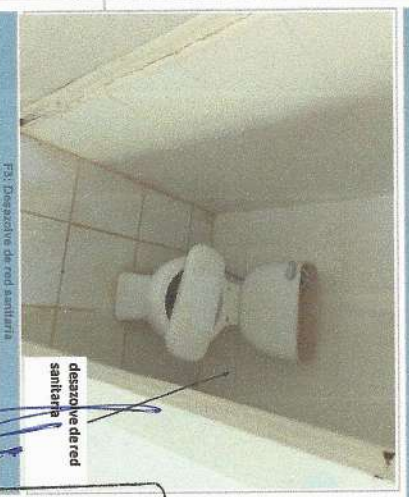

desazolve de red sanitaria



Bombas



Bombas

F1: Desazolve de red sanitaria

F2: Aires acondicionados en edificios A, B y C.

F3: Substitución de sistema de bombeo.

UICSLP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
24443006102  
11-A-V-E

Dra. Aurora Ordulín Cepreal  
Rectora

M.F. Víctor Hugo Sarvaán Sánchez  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se envía una pastas con: se podrán copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, E INTERCULTURAL (DGEU)
DIRECCION DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes: septiembre
Fecha de corte: 30-09-2022
Septiembre\_2022

POJO DE APORTACIONES RLA, TRPA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Calle: 3a 911, 242400000

Nombre: M.F. Víctor Hugo Galán Sánchez
Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 01-4641-3582070, 01-4641-3584459 y 01-4641-328444-55
Correo electrónico: pmvictorhugo@uiculp.mx

Responsables:
Nombre: N/A
Cargo: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A

Obra y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto (Obra de continuidad, Equipamiento, Adecuaciones y mejoras, Mantenimiento, Proyecto sustentable), Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alineación del proyecto, Acciones que surten efecto, Acciones por realizar, % de avance, Fechas (Inicio, Término), Observaciones, ¿Es susceptible de ser inaugurada?, ¿Cuántas veces se inauguró?, ¿Cuánto y cuándo se inauguró?, Entrega-Recpción (Acta, Entrega, Recpción), Acta de entrega-Recpción, Monto de Acta Administrativa.

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Finanzas
Monto autorizado: \$ 167,227.00
Monto ejercido: \$ 0.00
Remanente: \$ 167,227.00

En el presente se dio abono al tema con los recursos de la cuenta 357/2021-2022, UICULP RC 368/2021-2022, UICSLP RC 018/2022, UICSLP RC 042/2022, UICSLP RC 043/2022, UICSLP RC 046/2022, UICSLP RC 048/2022, UICSLP RC 049/2022, UICSLP RC 050/2022, UICSLP RC 051/2022, UICSLP RC 052/2022, UICSLP RC 053/2022, UICSLP RC 054/2022, UICSLP RC 055/2022, UICSLP RC 056/2022, UICSLP RC 057/2022, UICSLP RC 058/2022, UICSLP RC 059/2022, UICSLP RC 060/2022, UICSLP RC 061/2022, UICSLP RC 062/2022, UICSLP RC 063/2022, UICSLP RC 064/2022, UICSLP RC 065/2022, UICSLP RC 066/2022, UICSLP RC 067/2022, UICSLP RC 068/2022, UICSLP RC 069/2022, UICSLP RC 070/2022, UICSLP RC 071/2022, UICSLP RC 072/2022, UICSLP RC 073/2022, UICSLP RC 074/2022, UICSLP RC 075/2022, UICSLP RC 076/2022, UICSLP RC 077/2022, UICSLP RC 078/2022, UICSLP RC 079/2022, UICSLP RC 080/2022, UICSLP RC 081/2022, UICSLP RC 082/2022, UICSLP RC 083/2022, UICSLP RC 084/2022, UICSLP RC 085/2022, UICSLP RC 086/2022, UICSLP RC 087/2022, UICSLP RC 088/2022, UICSLP RC 089/2022, UICSLP RC 090/2022, UICSLP RC 091/2022, UICSLP RC 092/2022, UICSLP RC 093/2022, UICSLP RC 094/2022, UICSLP RC 095/2022, UICSLP RC 096/2022, UICSLP RC 097/2022, UICSLP RC 098/2022, UICSLP RC 099/2022, UICSLP RC 100/2022.

Dr. Aurora Oquilda Cornea
Rectora
UICSLP
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
RECTORIA
CIJAVE
24MSU06102

M.F. Víctor Hugo Galán Sánchez
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se regulará los trabajos que correspondan a la obra o proyecto. Se podrán iniciar antes de ser como sea necesario.
2 En esta sección se indicará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que los folios de inicio y término sean actualizados. Todos se los debe seguir del, mm y aa.

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEUSU)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Septiembre 2022**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

NO

FONDO DE FUERTES MÓVILES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


1

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tamuin




Porcentaje de avance

0

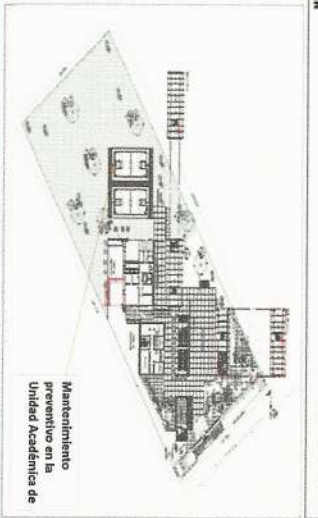

Callejón a la estación Tamuin Número 821 Col. Ampliación pueblo Nuevo CP. 79207 Tamuin S.L.P.


FOTOS

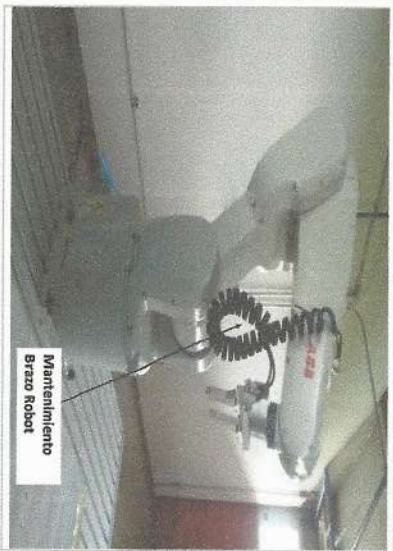

Mantenimiento Brazo Robot




Mantenimiento Brazo Robot

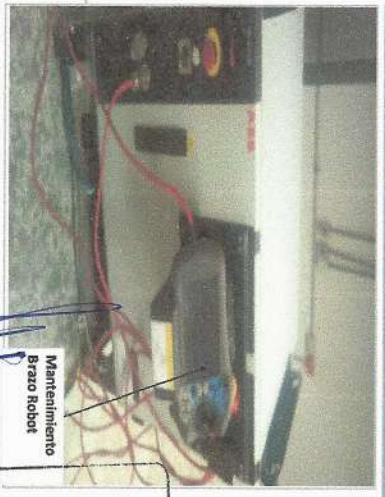

Mantenimiento Brazo Robot



Mantenimiento Brazo robot

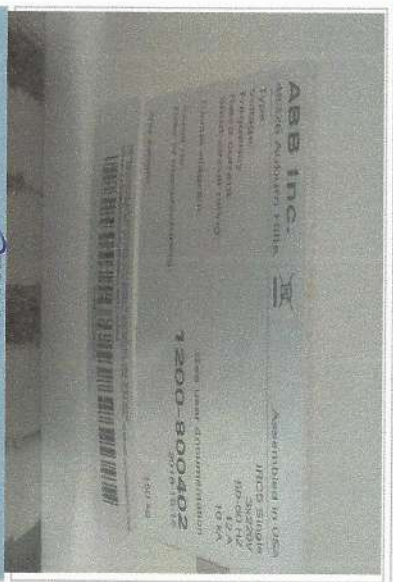

F4: Taller T-40

F3: Taller T-40

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
CLAVE 24MSU06102

Dr. Aurora Córdula Carras  
Rectora

M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tamuin de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

ANO



FONDO DE MANTENCIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE-SU)  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI



Nombre: UICSLP  
 Codigo: 01-444-134072-01-444-1-28-4409 y 01-444-1-28-44-02  
 Correo electronico: direccion@uicslp.mx

Entidad: Universidad Intercultural de San Luis Potosi  
 Clave del proyecto: 2AMSL00102

Responsables:  
 Director: N/A  
 Cargo: N/A  
 Telefono: N/A  
 Correo electronico: N/A

Objeto del Proyecto:  
 Mantenimiento preventivo en la Unidad Academica de Tanchahuiz

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Fianamiento	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *		Acciones que sustentan el avance *	Acciones por realizar	% de avance	Fecha *		Observaciones	¿Es susceptible (impugnación) (Causas)	¿Se ha concluido?				
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espectrologico				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino	Si	No	Si
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Academica de Tanchahuiz	X				\$ 169,251.00	\$		1	1457.30	En el presente se dio atención al tema con las oficinas UICSLP RC 387/2021-2022, UICSLP UICSLP RC 018/2022-2023, UICSLP RC 044/2022-2023, UICSLP RC 046/2022-2023, UICSLP RC 047/2022-2023, UICSLP RC 048/2022-2023, UICSLP RC 049/2022-2023, UICSLP RC 050/2022-2023. De igual manera se dio mantenimiento preventivo en los equipos acondicionados en edificio B y actualización de sistema de bombeo	De igual manera se dio mantenimiento preventivo en el edificio de la Unidad Académica de Tanchahuiz	100%	23/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosi (UICSLP) es la beneficiaria durante la SEGE y el EIFE operando el proceso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						\$ 169,251.00	\$ 50.00		1	1457.30												
						\$ 169,251.00	\$ 50.00		1	1457.30												

Dr. Aurora Ochoa Comba  
 Rectora



UICSLP  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI  
 RECTORIA  
 C. I. LA VE  
 24MSU06102

M.F. Victor Hugo Galvan Sanchez  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

Septiembre 2022  
 FECHA DE CORTE: 30-09-2022

1 Se registran los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden anotar varias filas como sea necesario.  
 2 En esta sección se detallan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van realizando en el reporte respectivo.  
 3 En los rubros que las columnas de todos y tantos están señaladas. Todas en sus columnas del ítem y así.

2022

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado  
**Septiembre 2022**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO: **1** Nombre de la obra:


**Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanchuliz**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance

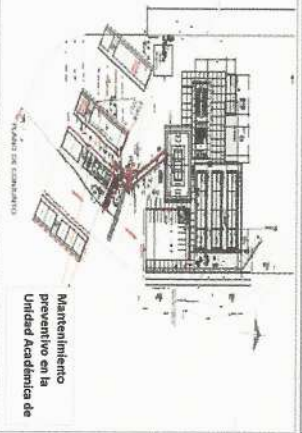

Francisco I. Mateo 568, Barrio Chacana, CP 78900, Tanchuliz, S.L.P.

FOTOS

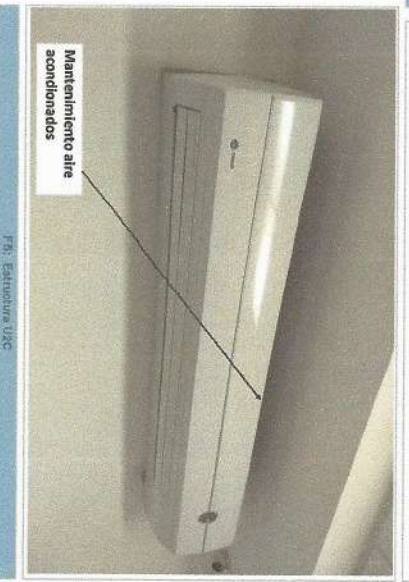

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tanchuliz de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

REC-TORIA  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
AVE 24 M S 006102

Dr. Aurora Juana Correa  
Rectora

M.F. Víctor Hugo Galván Sánchez  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

Año

**FAM**  
FORO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEESU)  
DIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/GERENCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Datos de la Universidad



Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**  
Entidad federativa: **San Luis Potosí**  
Código IMT: **911-246200102**

Formación

Nombre: N/A  
Cargo: N/A  
Teléfono: N/A  
Correo electrónico: N/A

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1				Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fecha 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada?								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino		¿En el terreno?	¿Con los recursos?	¿Con el personal?	¿Con los materiales?	¿Con los recursos humanos?				
																								Cumple con Actas			
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Idiomas de Escuelas	X				\$ 67,280.00	\$	\$			1	514.98		0	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLIP) es la instancia beneficiada donde la SEGE y el IEFE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
					Mantenimiento preventivo a 4 equipos acondicionados en edificio B, rehabilitación de cancelerías, reparación de trabajos de pintura y de maderas y sustitución de sistema de bombeo.					En el terreno se le asignó al tema en la oficina UICSLIP RC 397/2021-2022, UICSLIP RC 398/2021-2022, UICSLIP RC 399/2021-2022, UICSLIP RC 400/2021-2022, UICSLIP RC 401/2021-2022, UICSLIP RC 402/2021-2022, UICSLIP RC 403/2021-2022, UICSLIP RC 404/2021-2022, UICSLIP RC 405/2021-2022. Dar seguimiento al tema en el IEFE.					En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLIP) es la instancia beneficiada donde la SEGE y el IEFE ejecutan el proceso.												
										<b>TOTAL</b>					1	514.98			0	29/03/22	31/12/22						

30/2021 \$ 52.00  
 Dra. Aurora Odilia Corona  
 Rectora



M.É. Víctor Hugo Galván Sánchez  
 Subdirector del Planeación y Desarrollo Institucional

Mes reportado  
**Septiembre 2022**  
 FICSA/DC/CI/FE/ 24-09-2022

1 Se capturan los aspectos que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantos folios como sea necesario.  
 2 En esta sección se realizará el balance de forma breve y concisa los trabajos y acciones que se van a realizar en el periodo reportado.  
 3 Es importante que las fechas de inicio y término sean actualizadas. Todas en dos dígitos del mes y año.

2022

AÑO

FAM

COMO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
Septiembre\_2022  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre de la obra: **Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo**  
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Xolo-Tamulín Km. 47.5 Colonia Unidad  
CP 79840, Tanquian Escobedo S.L.P.



Porcentaje de avances

0

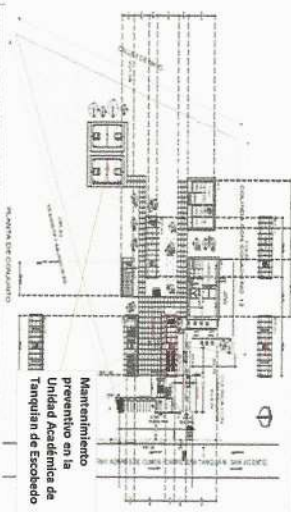

FOTOS




F1: Mantenimiento preventivo a 8 equipos de aires



F2: Edificio UAC

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

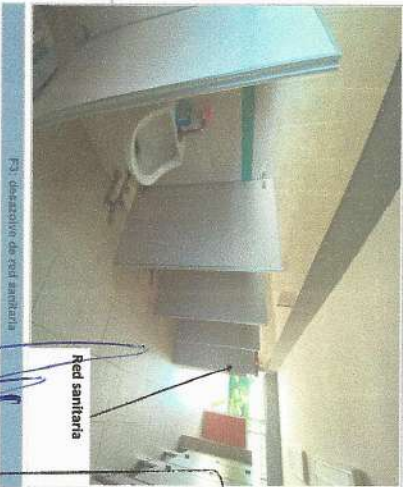

F3: detección de red sanitaria



F4: Sustitución de sistema de bombas



F5: sustitución de sistema de bombas

UICSLP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ

RECTORIA

CLAVE  
ZAMIS 006102

Dra. Aurora Ordaz Correa  
Rectora

M.F. Víctor Hugo Pava San Sánchez  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MULTILATERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)  
DIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado  
Septiembre 2022  
FECHA DE CORTE: 30 de 2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Entidad federativa: San Luis Potosí

Código postal: 712000

Nombre: M.F. Víctor Hugo Gavira Sánchez

Cargo: Subdirector de Fomento y Desarrollo Institucional

Teléfono: 01-441-134070, 01-441-134400 y 1-441-134442

Correo electrónico: dgfesusu@unslp.mx

Ferrocarril

Nombre: N/A

Cargo: N/A

Teléfono: N/A

Correo electrónico: N/A

Casa y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Restante	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto		Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Cualquier evento?)	Si ya fue inaugurado			Cuenta con Actas	Monto de Actas Administrativas	
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Acta de Inauguración	Cuenta con Actas de Inauguración?			Acta de Entrega Recepción
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Artes de Puyas				X	\$	184,730.00	\$		1	1823.39		0	28/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) se ha iniciado el proceso de rehabilitación del edificio B, reubicación de la instalación de Hidroneumática, decoración en las áreas de recepción y aplicación de pinturas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						\$	184,730.00	\$		1	1823.39		0	28/03/22	31/12/22								



Dr. Aurora Cecilia Gómez Rectoría

M.F. Víctor Hugo Gavira Sánchez Subdirector de Fomento y Desarrollo Institucional

1 Se aglutinan los espacios que corresponden a la obra y proyecto. Se pueden tener hasta cinco con una sola línea.  
2 En esta sección se detallan los hechos y acciones que se van realizando en el mes reportado.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día digno del mes y año.



2022

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESEU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DESEMPEÑO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CHOCUIS DE LOCALIZACION

Mes reportado  
**Septiembre 2022**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2022

UNIDAD DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance

0



Mantenimiento

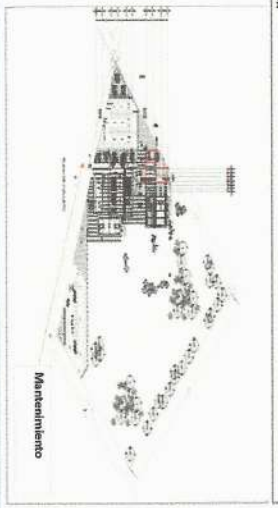

Mantenimiento

Av. Universidad No.29 Col. La Paz CP.78900 Villa de Reyes, S.L.P.

**FOTOS**



Desazolve de fosa

F1: Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias.




Mantenimiento

F2: Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias.



Muestreo de red

F3: Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias.

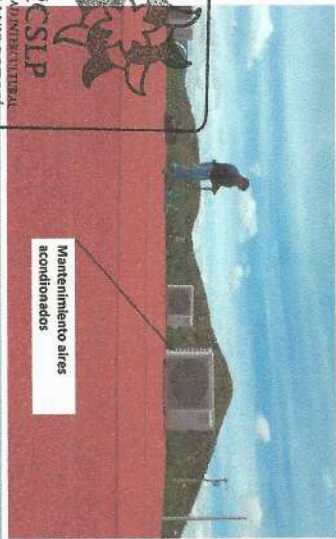

Mantenimiento aires acondicionados

F4: Edificio UIC



Aplicación de pintura

F6: Edificio UIC

Dra. Aurora María Correa  
Rectora



M.E. Víctor Manuel Sánchez  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Villa de Reyes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.
