

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**

**OFICIO: UICSLP RC 196/2022-2023.**

**ASUNTO: Informe trimestral FAM.**

San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de enero de 2023.

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
**Dirección de Fortaleciendo Institucional**  
**Presente.-**

Adjunto al presente, el cuarto informe con el avance trimestral correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año en curso, sobre el mantenimiento preventivo apoyado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2022 en beneficio de las Unidades Académicas de Cerritos, Ciudad Valles, Matlapa, Tamuín, Tamazunchale, Tanquian de Escobedo, Tancanhuitz y Villa de Reyes de la Universidad a mi cargo.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

**Atentamente**

  
**Dra. Aurora Ordoña Correa**  
**Rectora**



  
DR LOHA/MAE' MJAG

Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta, Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, para su conocimiento.

Mtra. Ma. de los Ángeles Gordillo Castañeda, Directora de Educación Intercultural, para conocimiento.

Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, para su conocimiento.

Archivo

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ**  
*"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"*

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SISTEMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Diciembre 2022**  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
 Entidad federativa: San Luis Potosí  
 Clave Inst: 1134450102

Nombre: Dr. Luis Osvaldo Hernández Arzaga  
 Cargo: Director de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-464-104970, 01-464-1384600 y 01-464-1384645  
 Correo electrónico: plamenu@uicpslp.edu.mx

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>		Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Facturas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Est susceptible de ser inaugurada? (Clases)	Si ya fue inaugurada		Cuentas con Acta	
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino	¿Cuándo se inauguró el evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Certificación	X				\$ 109,181.00	\$		1	1371.12	En el presente se dio mantenimiento preventivo a 8 equipos electrónicos en los edificios C y D, rehabilitación de la instalación hidráulica y hidrosuministro.	Mantenimiento preventivo a 8 equipos electrónicos en los edificios C y D, rehabilitación de la instalación hidráulica y hidrosuministro.	0	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP) se está realizando la inversión de la infraestructura física del IEFIE para ejecutar el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GLOBAL DEL PROYECTO													0	29/03/22	31/12/22						
						\$ 109,181.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	1371.12											

Dr. Aurora Gómez Corona  
 Directora



Dr. Luis Osvaldo Hernández Arzaga  
 Coordinador de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se clasificarán los espacios que correspondan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
 2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van a reflejar en el reporte fotográfico.  
 3 En los reportes que las fechas de inicio y término sean actualizadas. Todas en los espacios de inicio y fin.





2022

AÑO

FAM

FONDO DE APERTURAS ACADÉMICAS

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA, E INTERCULTURAL (DGEUSU)  
DIRECCION DE PORTAFOLIO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

16 de septiembre  
Diciembre 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INGRESO DE AVANCE MENSUAL

Nombre de la obra:

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Cerritos



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Alamo No. 51 Col. Aurora CP 79447 Cerritos, S.L.P



Porcentaje de avance

0

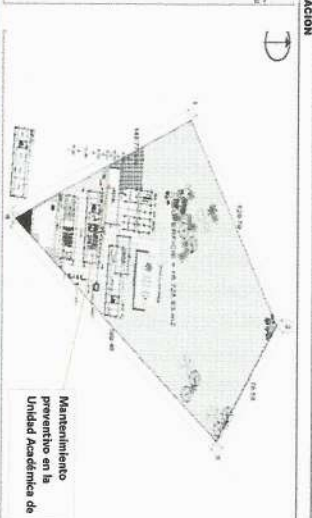

FOTOS




Mantenimiento aires acondicionados



rehabilitación de instalación hidráulica

Comentarios de los trabajos realizados:  
En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Cerritos de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

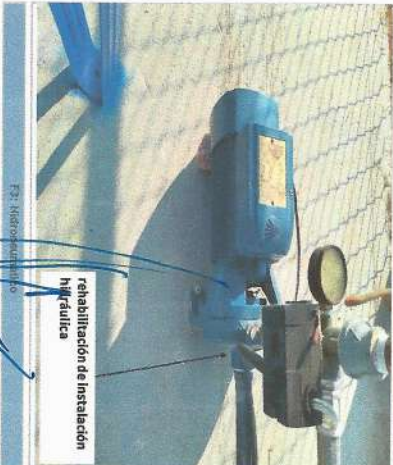

rehabilitación de instalación hidráulica



sistema hidroneumático



rehabilitación de instalación hidráulica

F3: Hidroneumático

F4: Hidroneumático

F6: Hidroneumático

Dra. Aurora Ordúña Correa  
Rectora

UICSLP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA

CLAVE  
24MSU06102

D. Luis Ocasio Hernández Arriaga  
Comisionado a la Subdirección de  
Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexen reportes fotográficos de todas las obras. Para dichos reportes se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

Año



FONDO DE INICIATIVAS MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA/FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
Entidad federativa: San Luis Potosí  
Código del SI: 206508702

Nombre: Dr. Luis Octavio Hernández Arzaga  
Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 01-444-534970, 01-444-7284445 y 01-444-1244442  
Correo electrónico: dhernandez@uicslp.edu.mx

Paralelo: \_\_\_\_\_

Responsables: Nombre: N/A, Cargo: N/A, Teléfono: N/A, Correo electrónico: N/A

Crea y Mantenimiento: \_\_\_\_\_

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1		Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fecha 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser liquidado? (Cualquier)	Si ya fue liquidado			Cuenta con Acas	
		Obra de continuidad	Equipamiento	Mejoras e instalaciones	Mantenimiento				Proyecto sustentable	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entregado (Cuentas)	Entregado (Recepción)	Actas de entrega	Monto de Actas Administrativas
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Matlapa			X		280,007.00	2,900,670.00		1	2,900.10	<p>En el presente se dio abasto al mantenimiento preventivo en edificios A, B, D y E, redistribución de mobiliario y aplicación de pintura.</p> <p>En el presente se dio abasto al mantenimiento preventivo en edificios A, B, D y E, redistribución de mobiliario y aplicación de pintura.</p> <p>En el presente se dio abasto al mantenimiento preventivo en edificios A, B, D y E, redistribución de mobiliario y aplicación de pintura.</p>	<p>Del seguimiento al día de hoy.</p> <p>En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí cuenta con la SICE y el IEFRE ejecutan el proceso.</p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
						280,007.00	2,900,670.00					100	29/03/22	11/11/22								

Dr. Luis Octavio Hernández Arzaga  
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional



Dr. Luis Octavio Hernández Arzaga  
Comisionado a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Mes reportado  
Diciembre 2022  
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

1 Se capturará los espacios que concierne a la obra o proyecto. Se pedirá mayor claridad si es necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los hitos o hitos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte de avance.  
3 Si el hito que se refiere a inicio y término están actualizados. Todos en dos dígitos: dd. mm y aa.



2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado

Diciembre 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

PROYECTO 1 Nombre de la obra

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Matlapa


CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO





Porcentaje de avance

100

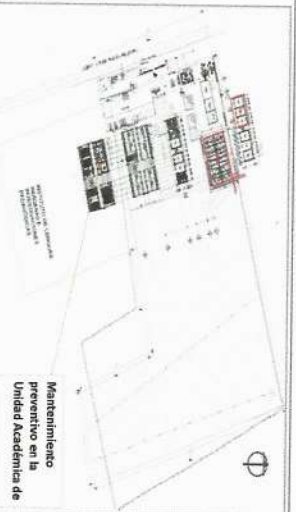

Carretera Nacional México Ixmiquilpan km 212, CP7990 Matlapa, S.L.P.

FOTOS

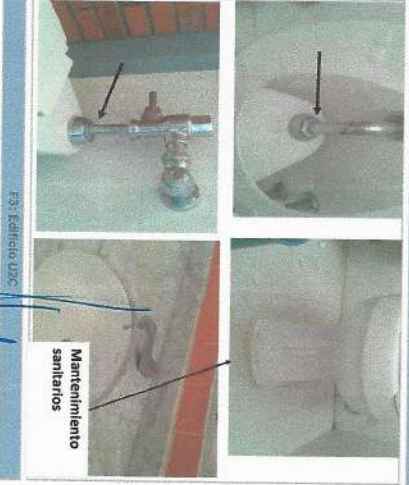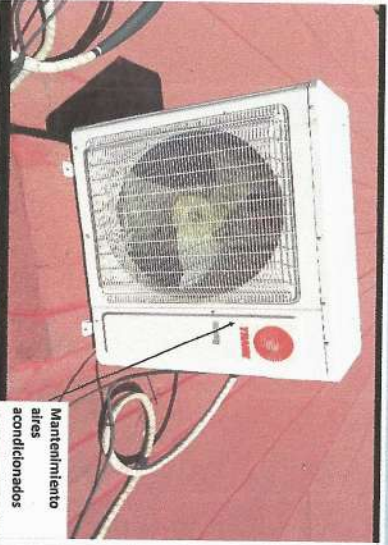

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Matlapa de la Universidad Intercultural a San Luis Potosí.

F1: Mantenimiento aires

F1: Medio prehabilitado

F3: Edificio UPC

F1: Espacio de conexión edificio E

F1: Espacio de conexión edificio E

Dr. Alejandra Oculina Correa  
Rectora

UICISP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA

Dr. Luis Ocaño Hernández Arreaga  
Comisionado a la Subdirección de  
Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña que podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
 Ciudad Federativa: San Luis Potosí  
 Clave Inst: 911-2465108102

Nombre: Dr. Luis Octavio Hernández Arriaga  
 Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-444-134670, 01-444-1-284440 y 01-444-1-284442  
 Correo electrónico: jarameno@uicusp.slp.mx

Parasoft

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

Fecha y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Formalmente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto *		Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fecha 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser retomado? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espediente/tipo				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuántos edificios inaugurados?	¿Cuántos módulos inaugurados?	Entrega- Recepción (Inicio)
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Temascalante	X				\$ 169,238.00	\$ 169,238.00		1	1124.54		En el ítem se se dio atención al tema con los recursos UICSLP RC 1480202-2023 UICSLP RC 1702022-2023 UICSLP RC 1782022-2023 UICSLP RC 1382022-2023 UICSLP RC 1312022-2023 UICSLP RC 1192022-2023 Medicina Oficio DG-489/2022 se financian del 100% y solicitando la reparación de un equipo, en esta sede ya se solicitó la reparación de los equipos, en esta sede de entrega.	Dirigido al tema en el EIFE del fondo.	100			En el desarrollo de este proyecto la UICSLP se benefició a través de la beneficiada desde la SEDE y el EIFE ejecutan el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						\$ 169,238.00	\$ 169,238.00		1	1124.54												
						\$ 169,238.00	\$ 169,238.00															

OBRAS CONCLUIDAS

Dr. Aurora Ocádiz Carrón  
 Rectora



Dr. Luis Octavio Hernández Arriaga  
 Coordinador de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se completan los espacios que corresponden a la data o proyecto. Se podrán omitir varias filas como sea necesario.  
 2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

Más reportes  
 Diciembre\_2022  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022



2022



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEUJ)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**Diciembre 2022**  
FECHA DE CORTE: 31-12-2022

FORMA DE APORTACIONES MULTIPLES


REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE MENSUAL

CIRCUITO DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

UICSSIP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSI

Procentaje de avance  
**100**

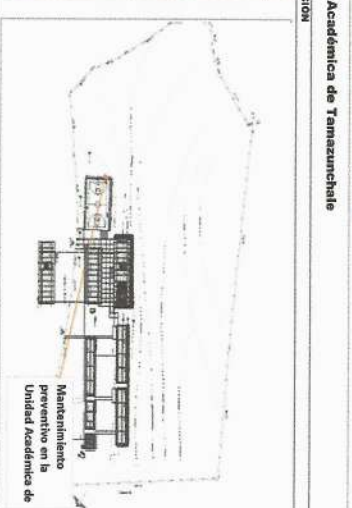

Av. Hidalgo S/N Comunidad Mecatlan y sus barrios  
CP/79971 Tamazunchale S.L.P

FOTOS



Mantenimiento aires acondicionados

F1: Aires acondicionados en edificios A, B y C.



Mantenimiento aires acondicionados

F2: Aires acondicionados en edificios A, B y C.



desazolve de red sanitaria

F3: Desazolve de red sanitaria



Bombas

F4: Sustitucion de sistema de bombeo.




Bombas

F5: Sustitucion de sistema de bombeo.

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecucion del fondo en la Unidad Academica de Tamazunchale de la Universidad Intercultural de San Luis Potosi.

Dra. Aurora Ornela Cordero  
Rectora



Dra. Luis Octavio Hernandez Arriaga  
Comisionado a la Subduracion de Planeacion y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla que podran copiar tantas paginas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la imagen antes, durante y despues de la obra.



2022


FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEESU)  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
 Diciembre\_2022  
 FECHA DE CORTE: 31-12-2022

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre:	Universidad Intercultural de San Luis Potosí	Nombre:	Dr. Luis Osvaldo Hernández Aréaga
Entidad federativa:	San Luis Potosí	Cargo:	Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional
Clave del proyecto:	24MSU06102	Teléfono:	01-464-138-70 / 01-464-1-248-400 / 01-464-1-248-400
		Cómo seleccionar:	Seleccionar en el menú
Nombre: Dr. Luis Osvaldo Hernández Aréaga Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 01-464-138-70 / 01-464-1-248-400 / 01-464-1-248-400 Cómo seleccionar: Seleccionar en el menú		RESPONSABLES Nombre: N/A Cargo: N/A Teléfono: N/A Cómo seleccionar: N/A	

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Fomentable	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance		Observaciones	¿Es susceptible de ser reprogramado? (Causas)	Si es susceptible		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacios/edificio	cantidad			metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con folios del expediente?	¿Obrar y Recepción (Actas)	Actas de Entrega y Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tamón	X				\$ 167,427.00	\$		1	1657.60		En el presente se dio abate al área con los trabajos de mantenimiento preventivo a nivel de pintura y limpieza de muros, pisos y techos. Se realizaron trabajos de pintura en las aulas, laboratorios y oficinas de la unidad. Se realizaron trabajos de limpieza en las aulas, laboratorios y oficinas de la unidad. Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo en las aulas, laboratorios y oficinas de la unidad. Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo en las aulas, laboratorios y oficinas de la unidad.	Dar seguimiento al avance del proyecto.	0	28/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí ha intervenido en las dependencias de la unidad académica de Tamón.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						\$ 167,427.00	\$ 50.00		1	1657.60												

OBRA CONCLUIDA

1 Se equivarán los siguientes que sustentan a la obra o proyecto. Se podrá anexar listas files como sea necesario.  
 2 En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismo que se validará conjuntamente con el reporte de avance.  
 3 Se reportará que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.

Dr. Aurora Ordaz Hernández  
 Rectora




Dr. Luis Osvaldo Hernández Aréaga  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional





2022

Año

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEESU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
Diciembre 2022  
FECHA DE CORTE: 31/12/2022

REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE MENSUAL


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI

Nombre de la obra: **Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tamulín**

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance  
**0**

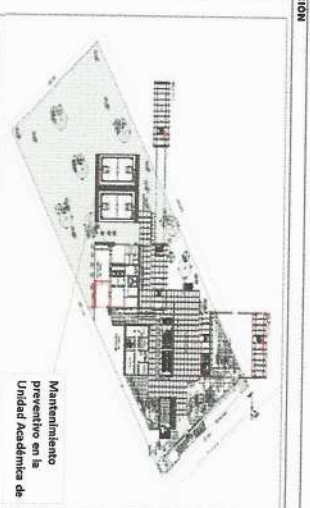

Carretera a la estación Tamulín Número 921 Col. Ampliación Pueblo Nuevo CP. 79207 Tamulín S.L.P.


FOTOS



Mantenimiento Brazo Robot



Mantenimiento Brazo Robot

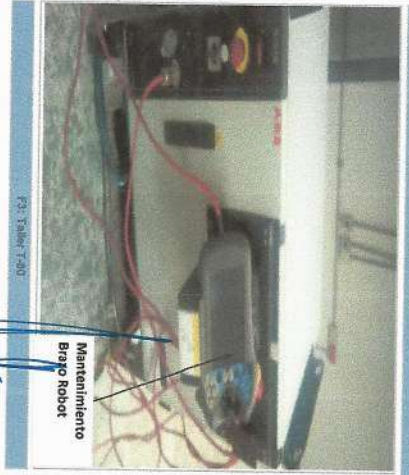

Mantenimiento Brazo Robot



Mantenimiento Brazo robot




F4-1 robot-1-40

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tamulín de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

Dra. Alba Graciela Correa  
Rectora



Dr. Luis Octavio Hernández Arriaga  
Comisionado a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, así podrá copiar todas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en español; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE-SU)  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Más reportado  
 Diciembre 2022  
 FECHA DE CORTE: 31-12-2022

FONDO DE APOYACIONES MULTILES

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
 Ciudad: Ixtaparilla, San Luis Potosí  
 Cero Sur 811 : 248406702  
 Nombre: Dr. Luis Octavio Hernández Arriaga  
 Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-444-1342070, 01-444-2849445 y 01-444-2849449  
 Correo electrónico: planacion@uicslp.mx

Nombre: UICSLP  
 Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01-444-1342070, 01-444-2849445 y 01-444-2849449  
 Correo electrónico: planacion@uicslp.mx

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

Nombre: N/A  
 Cargo: N/A  
 Teléfono: N/A  
 Correo electrónico: N/A

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ofrecido	Fechamiento	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, montos autorizados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Casos)	Si ya fue inaugurada			Acta con Actas
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espejal/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega-Admisión de Actas (Acta entrega)	Acta de Recepción	
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tancanhilz			X		\$ 168,831.00	\$ 168,831.00		1	1457.8			100	29/03/22	11/11/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí ha solicitado a la SGECE y al IEFRE ejecutar el proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						\$ 168,831.00	\$ 168,831.00	90.00	1	1457.8			100	29/03/22	11/11/22							

Dr. Aureo Quintanilla Arriaga  
 Rector



Dr. Luis Octavio Hernández Arriaga  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se exhiben los expedientes que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden anexar fotos como sea necesario.  
 2 En más sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vani reflejados en el reporte fotográfico.  
 3 El importe que se indica en todo y término está actualizado. Todos en los pesos de mil y más y en.



2022

XIII

FAM

FONDO DE INICIATIVAS MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEESU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tancanhuitz

SINOPSIS DE LOCALIZACION

UNIFICACION DE LA OBRA O PROYECTO


Mes reportado  
Diciembre 2022

FICHA DE COBRE: 31125882



Porcentaje de avance

100

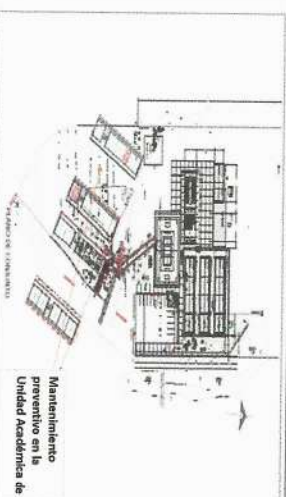

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de

Francoisco I Medero 568, Barrio Otzucama, CP. 79800, Tancanhuitz, S.L.P.

FOTOS



Bomba

F1: Sustitución de sistema de bombeo



Mantenimiento aire acondicionado

F2: Escritorio U2C



Bomba

F3: Sustitución de sistema de bombeo



Bomba

F4: Sustitución de sistema de bombeo



Mantenimiento aire acondicionado

F5: Escritorio U2C

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tancanhuitz de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

UICSSIP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
CALLE  
24 MARZO 6102  
Dra. Ana María Correa  
Directora

Dra. Luz Odario Hernández Arreaga  
Comisionada a la Subdirección de  
Fomento y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2022



Fecha reportado  
**Diciembre 2022**  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO



Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**  
 Entidad federativa: **San Luis Potosí**  
 Clave institucional: **238100502**  
 Responsables: **Recepción**  
 Nombre del responsable: **Recepción**  
 Nombre: **D. Luis Osorio Hernández Aragón**  
 Cargo: **Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Teléfono: **01-4444-1340273, 01-4444-1-28-84-00 y 01-444-1-28-84-42**  
 Correo electrónico: **planeacion@uicslp.edu.mx**  
 Ocas y Mantenimiento:  
 Nombre: **NA**  
 Cargo: **NA**  
 Teléfono: **NA**  
 Correo electrónico: **NA**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, maestros cuatreros y tipo de proyecto *			Acciones que sustentan el avance *	Acciones por realizar	% de avance	Fechas *		Observaciones	¿Es susceptible de ser reprogramado? (Sí/No)	Si ya ha programado		Cuenta con Actas		
		Equipoamiento						Específicos	cantidad	mensura				cantidad	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Fecha inicio- fin)	Acta Admistrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
		Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable																		
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanculán de Escobedo	X	\$	87,439.00	\$	-	\$	1	514.58			514.58	0	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí cuenta con la SEGE y el EIFE beneficiados desde el inicio del proceso.	NA	NA	NA	NA	NA	
			\$	87,439.00	\$	50.00	\$	1	514.58			50.00	0	29/03/22	31/12/22		NA	NA	NA	NA	NA	
			\$	87,439.00	\$	50.00	\$	1	514.58			50.00	0	29/03/22	31/12/22		NA	NA	NA	NA	NA	
<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>																						

**OBRA CONCLUIDA**

Dra. Aurora Octavio Cifra  
Rectora



UICSLP  
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
 DE SAN LUIS POTOSÍ  
 RECTORIA  
 C I A V E  
 7 4 M S U O 0 6 1 0 2

D. Luis Osorio Hernández Aragón  
 Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional

1. Se copiarán las especificas que correspondan a la obra o proyecto. Se podrán renovar tantas veces como sea necesario.  
 2. En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
 3. En importancia que las fechas de inicio y término sean detalladas. Todas en dos dígitos. del mes y año.



2022

24/01

FAM

FONDO DE ACTIVACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGE/SU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE E FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Reporte No. 1  
Nombre de la obra: Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo


CICLOS DE LOCALIZACION

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance: 0

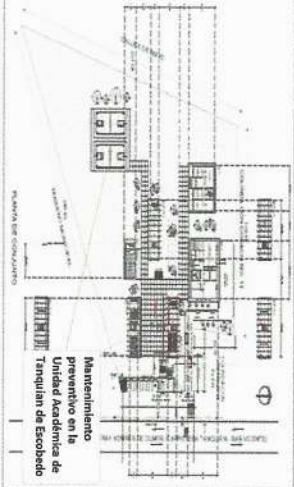

Carretera Xolot-Tamuli Km. 47.5 Colonia unidad CP 79840, Tanquian Escobedo S.L.P.

FOTOS

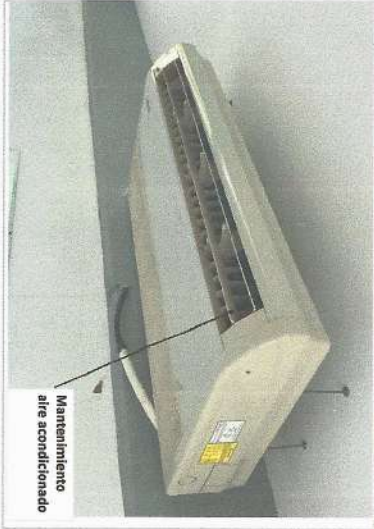

F1: Mantenimiento preventivo a 8 equipos de aire



F2: Equipo UIC

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.



F3: desahogue de red sanitaria



F4: Sustitución de sistemas de bombeo.



F5: Sustitución de sistemas de bombeo.

Dra. Aurora Orduna Coyas  
Rectora



Dr. Luis Ocasio Hernández Arzaga  
Comisionado a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2022

1/20

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEESU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/RENTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA/FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
Entidad Federativa: San Luis Potosí  
Clave del RI: 24MSU06102



Nombre: Dr. Luis Octavio Hernández Alzaga  
Cargo: Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional  
Teléfono: 01-444-9134070, 01-444-7284449 y 01-444-13444-42  
Correo electrónico: pzhawson@uicslp.mx

Financiamiento

Nombre: N/A  
Cargo: N/A  
Teléfono: N/A  
Correo electrónico: N/A

Orden y Mantenimiento


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Restante	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>		Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Cuaris)	Si ya fue inaugurada			Cuota con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especificaciones				Cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino	¿Cuántos con todos los eventos?		¿Cuándo y dónde se inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inicial)
1	Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Vieja				X	\$ 167,204.00	\$	\$	1	1,408.92	1,408.92			0	29/03/22	31/12/22	En el desarrollo de este proyecto la Universidad Intercultural de San Luis Potosí emitió la SEDG en el EFIRE correspondiente a la SEDG en el EFIRE que se emitió en el mes de agosto del presente año.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						\$ 167,204.00	\$0.00	\$0.00	1	1,408.92				0	29/03/22	31/12/22							

Dra. Aurora Ordaz Cortes  
Rectora

Dra. Elixaveth Hernández Alzaga  
Comisionada a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional



- 1 Se elaborará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán generar hasta cinco como sea necesario.
- 2 En esta sección se indicará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el informe fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día ceros: dd/mm/aa.

UICSLP  
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
CLAVE  
24MSU06102

Dra. Elixaveth Hernández Alzaga  
Comisionada a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional



2022

AÑO

**FAM**  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MULTIPLE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGEESU)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Diciembre 2022**  
MIGUALTECÓNTELE 31-153882

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 1 Nombre de la obra

Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de Ciudad Valles

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0



PLANO DE CONJUNTO


Mantenimiento preventivo en la Unidad Académica de

Carretera Ciudad Valles km 1.8, CP. 79000 Ciudad Valles S.L.P.

FOTOS




Mantenimiento aires acondicionados

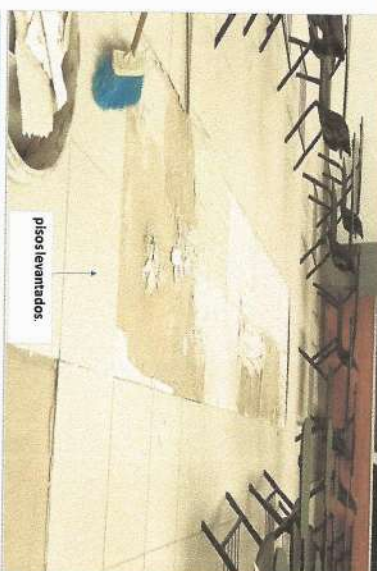


pisos levantados.

Comentarios de los trabajos realizados:

En el trimestre que se reporta se continúa con las actividades administrativas para la ejecución del fondo en la Unidad Académica de Ciudad Valles de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.

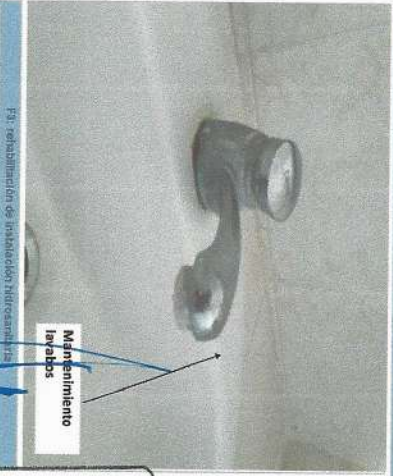

Mantenimiento lavabos

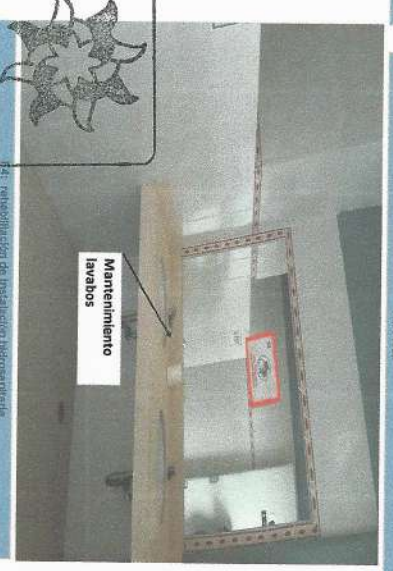

Mantenimiento lavabos




Mantenimiento sanitarios

F1: rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias

F2: rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias

F3: rehabilitación de instalación hidro-sanitaria

Dra. Aurora Ochoa Ferreras  
Rectora



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ  
RECTORIA  
CALLE 14 DE ABRIL  
744630001002

Dr. Luis Osorio Hernández Arreaga  
Coordinador de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para abarcarlas mejor, presenten, se podrá copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.





2022

ASIS

FAM

FONDO DE FORTALECIMIENTO MULTIS

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESU)  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre de la obra:

Mantenimiento preventivo en la Unidad Academica de Villa de Reyes

CICLO DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Av. Universidad No.29 Col. La Paz CP.79500 Villa de Reyes S.L.P.


Más reportado  
Diciembre 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022



Porcentaje de avance

0

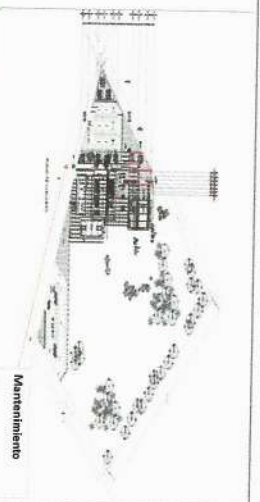

Mantenimiento

FOTOS



Desazolve de fosa



Mantenimiento

Comentarios de los trabajos realizados:


En el trimestre que se reporta se continua con las actividades administrativas para la ejecucion del fondo en la Unidad Academica de Villa de Reyes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosi.



Desazolve de red



Mantenimiento afres acondicionados

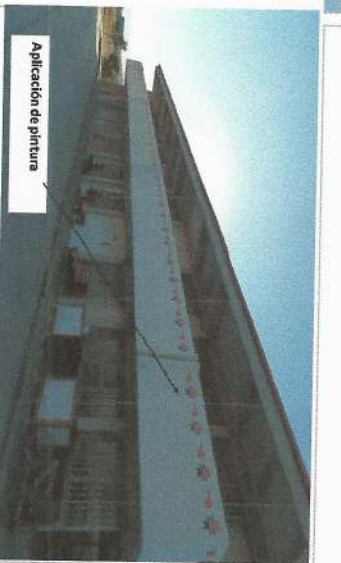

Aplicacion de pintura

Dr. Aurelio Ochoa Cortés

Rectore



F3: Rehabilitación de instalación hidro-sanitaria.

F4: Edificio V2C

Dr. Luis Octavio Hernández Araaga  
Comisario a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Este reporte de avance tiene validez legal, cuando se genera en el sistema de reportes de avance, de acuerdo a la configuración de los datos de la obra y del proyecto. No se debe alterar el contenido de este reporte, ya que se genera automáticamente a partir de la información ingresada en el sistema de reportes de avance.
